

UN AN APRÈS

Potasse de Mayumba

Que devient vraiment le projet signé en fanfare à Washington ?

Par Dr. Louis Kadryl YEMBI-YEMBI | Rubrique : Industries extractives, contrats et souveraineté | Temps de lecture : 14 min

RÉSUMÉ

Le 8 juillet 2025, à Washington, le chef de l'État présidait la signature d'un accord de **500 millions de dollars** sur le gisement de potasse de Mayumba. Un an plus tard, le dossier a bougé, mais pas là où les communiqués le laissaient croire. Les faits publics montrent un projet toujours **au stade de l'exploration et des études** : seule une tranche de 5 millions de dollars était fléchée sur la faisabilité, l'entreprise cherche encore le financement de la construction, aucun permis d'exploitation n'a été délivré et la demande n'est attendue qu'en 2027. Cette note actualise l'analyse, dresse la chronologie des douze derniers mois et confronte **ce que l'annonce disait à ce que les faits montrent**.

500 M\$

annoncés à Washington en juillet 2025

5 M\$

la seule tranche publiquement fléchée,
pour les études

80 %

la part de l'opérateur dans la société
qui détient le projet

2027

l'année attendue de la demande de
permis d'exploitation

RAPPEL DES FAITS

Le 8 juillet 2025, à Washington, en marge d'un sommet multilatéral consacré aux minéraux critiques, le chef de l'État C'BON a présidé la signature d'un accord portant sur **500 millions de dollars** (près de 280 milliards de FCFA) pour le développement du gisement de potasse de Mayumba. Le communiqué de la présidence annonçait une capacité de 800 000 tonnes d'engrais potassique par an et un potentiel de 975 emplois. La durée d'exploitation évoquée était de 56 ans.

Un détail, passé largement inaperçu, méritait déjà l'attention : le communiqué précisait qu'**une première tranche de 5 millions de dollars serait consacrée aux études de faisabilité**, le financement principal devant soutenir ensuite la phase de développement et la construction des infrastructures. Autrement dit, ce qui était présenté comme un investissement acquis était en réalité un accord de financement, dont un pour cent seulement se trouvait fléché.

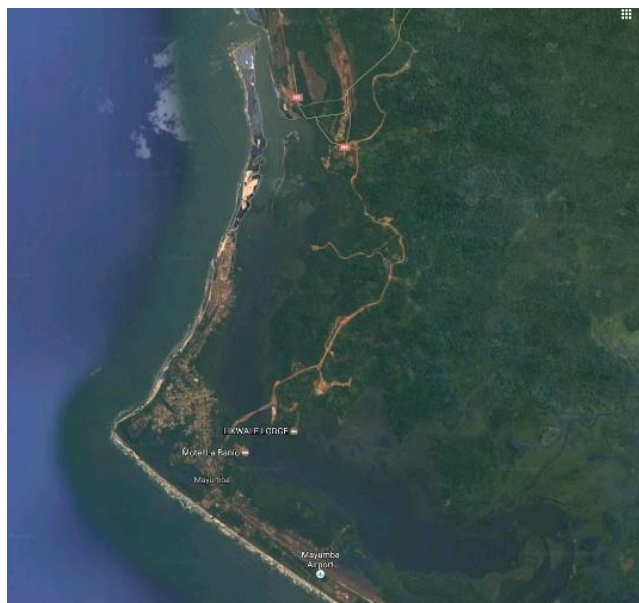


Figure 1 — La côte de Mayumba, dans la province de la Nyanga.

POURQUOI CETTE FENÊTRE S'OUVRE MAINTENANT

- La Russie et la Biélorussie, deux des trois plus grands producteurs mondiaux, sont sous sanctions et restrictions.
- Le Canada, seul grand producteur jugé stable, ne couvre plus à lui seul la demande mondiale.
- La demande d'engrais reste soutenue par la pression sur la sécurité alimentaire.
- Conséquence : un espace de marché s'ouvre, mais il ne restera pas ouvert indéfiniment.

1. UN AN APRÈS : CE QUI A RÉELLEMENT AVANCÉ

Il faut le reconnaître d'emblée, car l'honnêteté intellectuelle l'exige : le dossier n'est pas resté lettre morte. Contrairement à beaucoup d'annonces gabonaises analysées dans nos notes, celle-ci a été suivie de faits vérifiables.

Une estimation actualisée des ressources a été publiée fin décembre 2025, faisant état de **648,2 millions de tonnes mesurées et de 1,8 milliard de tonnes indiquées**, à une teneur d'environ 15,6 à 15,7 % de chlorure de potassium. En février 2026, un permis d'exploration supplémentaire dit « Haute Banio » a été octroyé, portant le domaine concédé à près de 1 500 km² et lui donnant un accès direct à la côte. Une étude de faisabilité définitive et une étude d'impact environnemental et social ont été engagées en parallèle, confiées à des bureaux d'études spécialisés, avec une échéance annoncée à la fin 2026. Une troisième campagne de forage (quatre sondages, environ 4 000 mètres) a démarré en mai 2026.

Le ministre des Mines a conduit une délégation au congrès annuel des prospecteurs et développeurs miniers à Toronto en mars 2026, où il a publiquement exigé des retombées socio-économiques concrètes pour la province de la Nyanga : infrastructures, écoles, établissements de santé, résorption du chômage. Il s'est ensuite rendu sur le site d'exploration en début de la saison sèche. Le projet est donc réel, actif, et suivi au plus haut niveau.

2. MAIS CE QUE L'ANNONCE LAISSAIT ENTENDRE N'EST PAS CE QUE MONTRENT LES FAITS

C'est ici que notre regard (Analyse) de citoyen reprend ses droits. Car entre le récit de juillet 2025 et la réalité documentée en début de saison sèche, l'écart est considérable, et il porte sur **cinq points qui touchent tous à la souveraineté**. La comparaison présentée en figure 3 les met côte à côte.

Le premier concerne le financement. Un an après, l'opérateur indiquait toujours être **en discussion avec des institutions financières internationales** pour financer la construction. Les 500 millions annoncés ne constituent donc pas un capital disponible mais un cadre de financement à concrétiser.

La deuxième touche à l'identité même du partenaire. La présidence a présenté une **« société minière américaine »**, formule reprise par l'ensemble de la presse gabonaise. L'opérateur est en réalité une société canadienne, cotée à la Bourse de croissance de Toronto et domiciliée en Colombie-Britannique. Le lien américain existe, il tient à la scène de Washington et à l'appui d'une agence publique américaine de financement du développement, mais il ne fait pas de l'entreprise une société américaine. Une erreur de cette nature, non corrigée pendant un an, en dit long sur la circulation de l'information dans nos institutions.

Le troisième est le plus important pour la suite : **il n'existe à ce jour ni permis d'exploitation, ni convention minière publiée**. Le projet dispose de permis d'exploration. La demande de permis d'exploitation n'est attendue qu'en 2027, une fois l'étude de faisabilité achevée. Les 56 ans et les 800 000 tonnes annuelles restent donc des projections, non des engagements juridiquement en vigueur.

Le quatrième porte sur la structure de propriété. Le gisement est détenu par une société de droit gabonais, elle-même contrôlée à 80 % par l'opérateur depuis avril 2026, celui-ci ayant vocation à en détenir la totalité une fois l'étude de faisabilité déposée. Aucune participation publique gabonaise au capital n'a été rendue publique. Le cinquième, enfin, concerne les infrastructures : la seule réalisation connue est la réhabilitation d'une ancienne route entre Mayumba et les sites de forage, destinée à la logistique d'exploration. Le port en est au stade des options évaluées.

DATE	CE QUI S'EST PASSÉ	CE QU'IL FAUT EN RETENIR
30 nov. 2023	Première rencontre entre le chef de l'État gabonais et le président du conseil d'administration de l'opérateur, en marge de la COP28 à Dubaï.	Le dossier naît d'un contact de sommet, non d'un appel d'offres public.
8 juillet 2025	Washington : signature d'un accord de financement de 500 millions de dollars, en marge du sommet sur les minéraux critiques. Une première tranche de 5 millions est affectée aux études de faisabilité.	Un accord de financement, non un investissement acquis. Un pour cent du montant est fléché.
29 déc. 2025	Publication d'une estimation actualisée des ressources : 648,2 Mt mesurées, 1,8 Gt indiquées et 3,56 Gt inférées, à environ 15,6-15,7 % de KCl.	Le gisement est immense. Mais l'essentiel du tonnage relève de la catégorie « inférée », la moins fiable.
24 févr. 2026	Octroi d'un permis d'exploration supplémentaire dit « Haute Banio », de 261,39 km ² , portant le domaine à environ 1 500 km ² et incluant un accès direct à l'océan.	L'État élargit le périmètre concédé avant même d'avoir instruit une demande d'exploitation.

DATE	CE QUI S'EST PASSÉ	CE QU'IL FAUT EN RETENIR
1-4 mars 2026	Congrès PDAC à Toronto : le ministre des Mines conduit une délégation et exige des retombées socio-économiques concrètes pour la Nyanga.	L'exigence est publiquement formulée — mais elle reste verbale, sans instrument contraignant connu.
19 mars 2026	L'étude de faisabilité définitive et l'étude d'impact environnemental et social sont en cours, confiées à des bureaux européens . Des options portuaires près de Mayumba sont à l'étude et des discussions sont engagées avec des institutions financières pour financer la construction.	Huit mois après la signature, le financement de la construction n'est pas bouclé et le port n'est qu'une option. La compétence en étude d'impact environnemental et social est noyée dans la Banio
15 avril 2026	L'opérateur porte sa participation à 80 % de la société qui détient le projet ; les 20 % restants sont conditionnés à l'achèvement de l'étude de faisabilité.	La montée au capital se fait entre partenaires privés. Aucune participation publique gabonaise n'est rendue publique.
12 mai 2026	Lancement d'une troisième phase de forage : quatre sondages, environ 4 000 mètres au total, jusqu'à 1 000 mètres de profondeur. Une ancienne route reliant Mayumba aux sites a été réhabilitée.	La seule infrastructure réalisée à ce jour sert la logistique de forage, pas l'évacuation du minerai.
Juillet 2026	Visite du ministre des Mines sur le site d'exploration. L'opérateur adopte par ailleurs un régime de publication financière semestriel, allégeant ses obligations trimestrielles.	Moins d'information publique, au moment précis où le projet entre dans sa phase décisive.
Fin 2026	Achèvement annoncé de l'étude de faisabilité définitive et de l'étude d'impact environnemental et social.	Échéance à surveiller : c'est elle qui conditionne tout le reste. De plus elle est réalisée par des entreprises Européenne.
2027	Dépôt attendu de la demande de permis d'exploitation.	À ce jour, il n'existe donc ni mine, ni permis d'exploitation, ni convention publiée.

Figure 2 — Chronologie du dossier, de la COP28 à l'été 2026, avec ma lecture critique de chaque étape.

CE QUE L'ANNONCE LAISSAIT ENTENDRE	CE QUE MONTRENT LES FAITS PUBLICS, UN AN APRÈS
Un investissement de 500 millions de dollars pour le Gabon.	Un accord de financement, dont seule une tranche de 5 millions (un pour cent) était publiquement affectée aux études. En mars 2026, l'opérateur discutait encore avec des institutions financières pour financer la construction. A ce jour de la publication de cette note, aucune information
Un partenariat avec une société minière américaine.	L'opérateur est une société canadienne, cotée à la Bourse de croissance TSX et domiciliée en Colombie-Britannique. Le lien américain tient à la scène de Washington et à l'appui d'une agence publique américaine de financement du développement.
Une exploitation de 56 ans et 800 000 tonnes par an.	Le projet est encore au stade de l'exploration et des études. Aucun permis d'exploitation n'a été délivré : la demande n'est attendue qu'en 2027, après l'étude de faisabilité.
975 emplois directs, selon le communiqué de la présidence.	D'autres reprises de l'annonce décomposent ce total en 375 emplois directs et 600 indirects. L'écart n'a jamais été tranché publiquement.
Un projet structurant pour la souveraineté minière du pays.	Le gisement est détenu par une filiale gabonaise elle-même contrôlée à 80 % par l'opérateur, qui vise 100 %. Aucune participation publique gabonaise au capital n'a été rendue publique.
Des infrastructures pour évacuer la production.	La seule réalisation connue est la réhabilitation d'une ancienne route entre Mayumba et les sites de forage, destinée à la logistique d'exploration. Le port en est au stade des options évaluées.

Figure 3 — L'écart entre le récit officiel de juillet 2025 et les faits publics à la saison sèche 2026.

3. LE DÉSERT LOGISTIQUE N'A PAS DISPARU

Le gisement reste situé dans une zone quasiment enclavée : il n'existe **ni route adaptée au transport industriel, ni port en état** pour évacuer des centaines de milliers de tonnes de minerai chaque année. Réhabiliter une piste pour acheminer des foreuses est une chose ; construire une chaîne

d'évacuation capable d'absorber 800 000 tonnes annuelles en est une autre, sans commune mesure.

La question de départ demeure donc entière, et elle est même devenue plus pressante : qui financera ces infrastructures ? Le silence des autorités sur ce point est d'autant plus préoccupant que l'opérateur cherchait encore, au printemps 2026, le capital nécessaire à la construction. Si la réponse devait être « l'État », il faudrait la traiter pour ce qu'elle est

(un investissement public dans un projet privé) et l'arbitrer comme tel, publiquement.

TROIS QUESTIONS TOUJOURS SANS RÉPONSE PUBLIQUE

- Qui finance le port, les routes et l'électricité ?
- Quelle part de la valeur créée revient effectivement à l'État, et sous quelle forme ?
- Quelles obligations environnementales seront opposables à l'exploitant, et qui les vérifiera ?

4. MODÈLE AGRICOLE DURABLE OU NOUVEAU PIÈGE EXTRACTIF ?

La potasse est un intrant important pour le développement agricole. Le Plan national de développement pour la transition affirmait vouloir faire du pays un **grenier agricole de l'Afrique centrale à l'horizon 2030**. Une production locale d'engrais potassique pourrait, dans ce cadre, soutenir la souveraineté alimentaire nationale et réduire la facture d'importation.

Mais rien, dans les éléments publics disponibles un an après, ne garantit la transformation de la potasse sur place ni son intégration dans une filière agricole nationale. La communication de l'opérateur, destinée à ses investisseurs,

décrit un gisement de basse altitude proche de l'Atlantique, destiné à approvisionner les marchés agricoles internationaux. C'est cohérent avec sa logique d'entreprise, ce n'est pas nécessairement celle du Gabon. Si le projet reste centré sur l'exportation brute, le pays retombera dans un schéma extractif classique : sans création de valeur locale, sans transfert de compétences et sans soutien au développement rural.

5. LE MIRAGE DU PROGRÈS SANS LES FONDATIONS

Le développement d'un pays ne commence pas par des accords signés à l'étranger, mais par **la formation des citoyens, la maîtrise technologique et l'institution d'un système de contrôle autonome**. Peut-on sérieusement croire que le Gabon tirera profit d'une exploitation minière sur plus d'un demi-siècle sans disposer des outils pour l'auditer, la contrôler, la suivre et l'évaluer ?

Cette question, prend aujourd'hui un tour très concret. Les études de faisabilité et d'impact environnemental sont conduites par des bureaux étrangers. Elles seront remises au gouvernement gabonais à l'appui de la demande de permis. Qui, dans l'administration, aura la compétence technique pour les contredire ligne à ligne ? La capacité d'expertise nationale ne s'improvise pas le jour où le dossier arrive sur le bureau du ministre : elle se construit maintenant, pendant que le projet est encore en phase d'études.

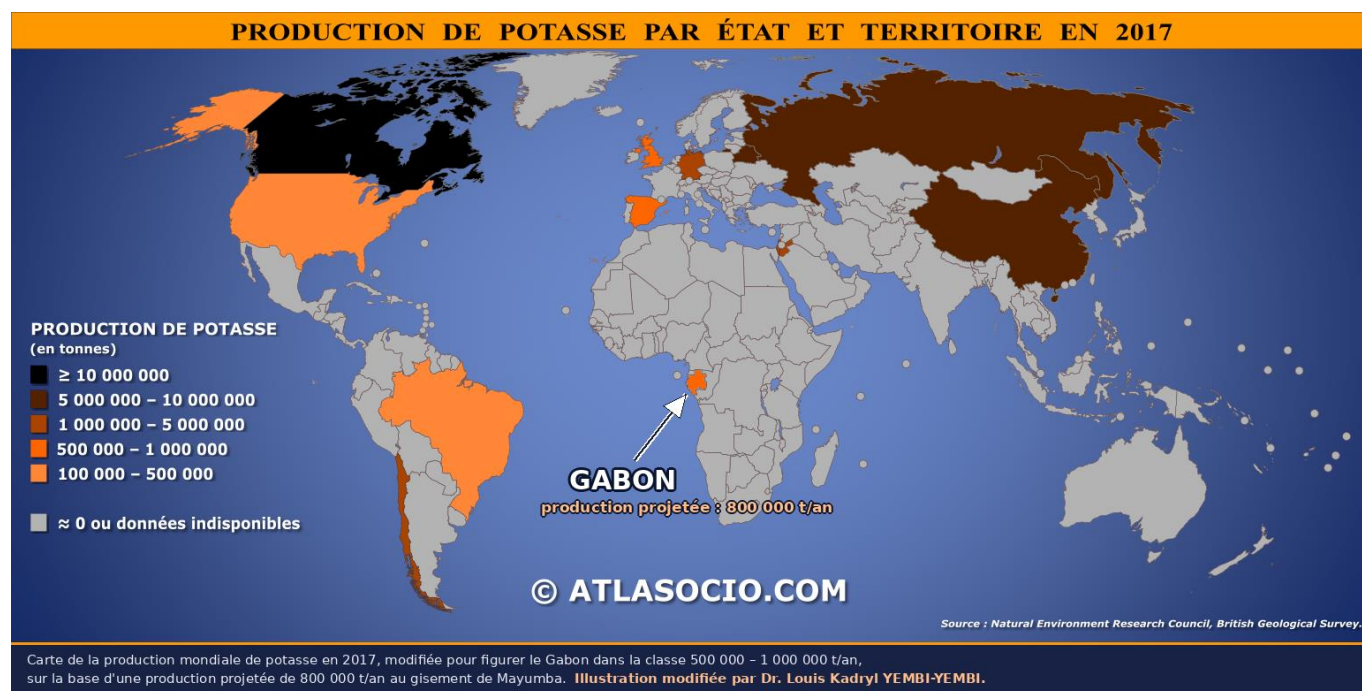


Figure 4 — Carte de la production de potasse dans le monde, données de 2017 avec l'ajout du Gabon sur la carte avec sa production de Mayumba estimée. Cette carte modifiée est juste à titre illustrative (lien vers la carte d'origine : <https://atlasocio.com/cartes/recherche/selection/production-potasse.php>)

CRITÈRE	ÉVALUATION	COMMENTAIRE, ACTUALISÉ EN AOÛT 2026
Durée du contrat 56 ans annoncés	EXCESSIVE	Le standard international se situe entre 25 et 35 ans. Aucune clause de revue périodique n'a été rendue publique.
Financement effectif 500 M\$ annoncés	NON BOUCLÉ	Seule une tranche de 5 millions était fléchée sur les études. Le financement de la construction était encore en discussion en mars 2026.
Statut juridique du projet	EXPLORATION	Le projet dispose de permis d'exploration, pas d'un permis d'exploitation. La demande n'est attendue qu'en 2027.
Participation de l'État	NON PUBLIÉE	Le gisement est détenu par une filiale contrôlée à 80 % par l'opérateur, qui vise la totalité du capital.
Emplois annoncés 975 au total	À CLARIFIER	Le communiqué évoque 975 emplois directs ; d'autres reprises parlent de 375 directs et 600 indirects.
Ressource géologique 648 Mt mesurées	SUBSTANTIELLE	La base de ressources est réelle et significative, même si l'essentiel du tonnage total reste en catégorie inférée.
Avancement technique DFS et EIES en cours	RÉEL	Les études sont engagées, confiées à des bureaux spécialisés, avec une échéance annoncée à fin 2026.
Infrastructures d'évacuation port, routes, énergie	NON TRANCHÉES	Le port en est au stade des options évaluées. Le financement de ces infrastructures n'est pas documenté publiquement.
Contenu local et transformation	NON PRÉCISÉ	Aucune usine de transformation ni valorisation locale de la ressource n'apparaît dans les éléments publics.
Transparence contractuelle	INSUFFISANTE	La convention n'a pas été publiée. L'opérateur a par ailleurs allégé ses obligations de publication financière trimestrielle.

Figure 5 — L'accord passé au crible de dix critères, actualisés à la saison sèche 2026.

« Un an après la cérémonie, il n'y a toujours ni mine, ni permis d'exploitation, ni convention publiée. »

Ce n'est pas un échec : c'est le rythme normal d'un projet minier. Le problème est ailleurs, dans l'écart entre ce rythme réel et la manière dont l'annonce a été présentée aux gabonais.

SIX EXIGENCES, À FAIRE VALOIR AVANT LE PERMIS D'EXPLOITATION

1	Profiter de la fenêtre : tout se négocie avant le permis C'est le point que change l'année écoulée. Tant que le permis d'exploitation n'est pas délivré, l'État conserve son levier de négociation maximal. Une fois la convention signée et le permis accordé, il ne restera plus qu'à constater. La demande étant attendue en 2027, les mois qui viennent sont décisifs, et ils doivent servir à autre chose qu'à des déclarations d'intention.
2	Publier la convention et la grille fiscale La société gabonaise est en droit de connaître les conditions fiscales, environnementales, sociales et stratégiques de l'accord. Un an après la signature, aucun de ces éléments n'est public. Les précédents de contrats opaques, assortis d'exonérations massives, ont montré le coût de ces pratiques.
3	Trancher publiquement la question des infrastructures Qui finance le port, les routes et l'électricité ? Le silence sur ce point est d'autant plus problématique que l'opérateur cherchait encore, au printemps 2026, le financement de la construction. Si la réponse devait être « l'État », il faudrait alors la traiter pour ce qu'elle est : un investissement public dans un projet privé, à arbitrer comme tel.
4	Garantir des clauses de renégociation périodique Une revue tous les dix ou quinze ans est la condition minimale pour qu'un engagement de 56 ans reste adaptable. Les prix des matières premières, les technologies d'extraction et les normes environnementales évolueront plusieurs fois d'ici l'échéance : un contrat figé aujourd'hui deviendra mécaniquement défavorable demain.

5

Inscrire des obligations de contenu local chiffrées et vérifiables

L'exigence de retombées pour la Nyanga a été formulée publiquement par le ministre des Mines en mars 2026. Elle ne vaudra que si elle devient un engagement contractuel assorti d'objectifs datés, d'indicateurs et de sanctions : emplois, sous-traitance, formation, et transformation locale d'une part de la production.

6

Structurer un suivi indépendant et un fonds souverain

L'État doit se doter des moyens d'auditer, contrôler et évaluer l'exploitation sur toute sa durée, ce qui suppose des compétences nationales formées dès maintenant, pendant que le projet est encore en phase d'études. Un fonds souverain garantirait par ailleurs que les générations futures bénéficient des richesses extraites aujourd'hui.

CONCLUSION

La fenêtre est encore ouverte, elle ne le restera pas

Douze mois après Washington, le bilan est double. D'un côté, le projet avance réellement : les ressources ont été réévaluées, le domaine minier s'est étendu, les études de faisabilité et d'impact sont engagées, une troisième campagne de forage est en cours. Ce n'est pas un dossier fantôme. De l'autre, aucune des questions que posait cette note il y a un an n'a reçu de réponse publique : ni le financement réel, ni le sort des infrastructures, ni la place de l'État au capital, ni les obligations environnementales opposables.

Le décalage le plus instructif reste celui du récit. On a présenté aux gabonais un investissement de 500 millions de dollars ; les faits publics décrivent **un accord de financement dont une tranche de 5 millions finançait des études**, porté par une société canadienne encore en quête du capital nécessaire à la construction. Entre les deux, il y a la différence entre une annonce politique et un projet industriel.

Il reste une bonne nouvelle, et elle est décisive : **rien n'est encore irréversible**. Le permis d'exploitation n'est pas délivré, la convention n'est pas signée. C'est maintenant, et non après 2027, que se jouent la durée, le partage de la valeur, le contenu local et les garanties environnementales. Le progrès économique ne peut précéder le développement humain et institutionnel : former nos concitoyens et doter nos administrations d'outils de contrôle n'est pas un préalable optionnel, c'est la condition pour que ce gisement devienne autre chose qu'une rente d'exportation de plus.

SOURCES

[1] Communiqué de la présidence de la République gabonaise, 8 juillet 2025 (presidence.ga) : accord de financement de 500 millions de dollars, première tranche de 5 millions affectée aux études de faisabilité, dialogue initié à la COP28 le 30 novembre 2023.

[2] Gabonreview, 9 juillet 2025 et 4 mars 2026 : signature de l'accord, puis audience du ministre des Mines aux responsables de l'opérateur en marge du PDAC de Toronto et exigence de retombées pour la Nyanga.

[3] Communiqués de l'opérateur et reprises de presse financière (février à juillet 2026) : permis « Haute Banio » de 261,39 km² portant le domaine à environ 1 500 km² ; estimation actualisée des ressources du 29 décembre 2025 ; montée à 80 % du capital de la société détentrice ; lancement d'une phase 3 de forage de quatre sondages ; passage à une publication financière semestrielle.

[4] Les mentions « non publiée », « non tranchée » et « non précisé » de la figure 4 signalent une absence d'information publique à la date de rédaction, et non un manquement avéré. Le ratio d'un emploi pour environ 820 tonnes annuelles est calculé par l'auteur.
